

# Ladok3

## SA-referensgruppen 2012-09-19



# Aktuell införandeplan

1. Årsredovisning (kan köras parallellt i Ladok2 och Ladok 3 - verifiering)
2. "Uppföljning"
3. Examen + Registrering + Resultat
4. Kataloginfo / Utbildningsinformation



Figur 2: Driftsättningsordning för Ladok3 i produktionsmiljö.

**Verksamhetsmässigt: Våldigt stor tyngdpunkt på steg 3.**

**Teknikmässigt: De flesta integrationer behöver byggas om först till steg 3, men måste testas långt före.**

Nyhet:

Examen införs alltså inte i ett eget steg före reg + res som var planen förut



# Aktuell tidplan

Införandesteg	Migrerings- och integrationstestmiljö	Acceptanstestmiljö	Påbörjad produktionssättning <sup>2</sup>
1	januari 2015	maj 2015	oktober 2015
2	maj 2015	oktober 2015	mars 2016
3	januari 2016	maj 2016	oktober 2016
4	januari 2016	oktober 2016	mars 2017

*Tabell 1: Driftsättningsplan*

**Tidpunkterna är när första lärosätet kör igång med Ladok3.  
Steg 4 beräknas infört av samtliga UoH i november 2017.**



# Ladok3 - de viktigaste punkterna

- Registervård och migrering av data Ladok2 -> Ladok3
  - Görs främst av Ladokavdelningen med stöd av LDC
- Alla integrationer med Ladok behöver skrivas om
  - Respektive systemägare med stöd från införandeprojektet
  - Mycket tester behövs + feedback till Ladok3-projektet



# Ladok3 - de viktigaste punkterna

- Utbildning och användarstöd under införandet
  - Införandeprojektet tillsammans med olika berörda
- Förändrat regelverk? – Ladok3 bygger mer än Ladok2 på självbetjäning
  - sekt. Student och utbildning
- Löpande support – mer självbetjäning kräver mer avancerat stöd ("Varför kan jag inte registrera mig?")
- *En driftcentral för alla UoH*




# Integrationer på LU

	Organisationsnivå			
Sektion/ fakultet	CF	Fak	Inst	Totalt
EHL		3	1	4
ER	3			3
HT		5		5
LDC	2			2
LS	3			3
LTH		9	2	11
M		2		2
N			3	3
S			1	1
SU	2			2
UB	2			2
Totalt	12	19	7	38

- Integrationerna är allt från stora och komplexa till små och enkla
- Behövs alla? – Vi har behov som ska uppfyllas!




# Testning – parallell testning/godkännande av data och teknik

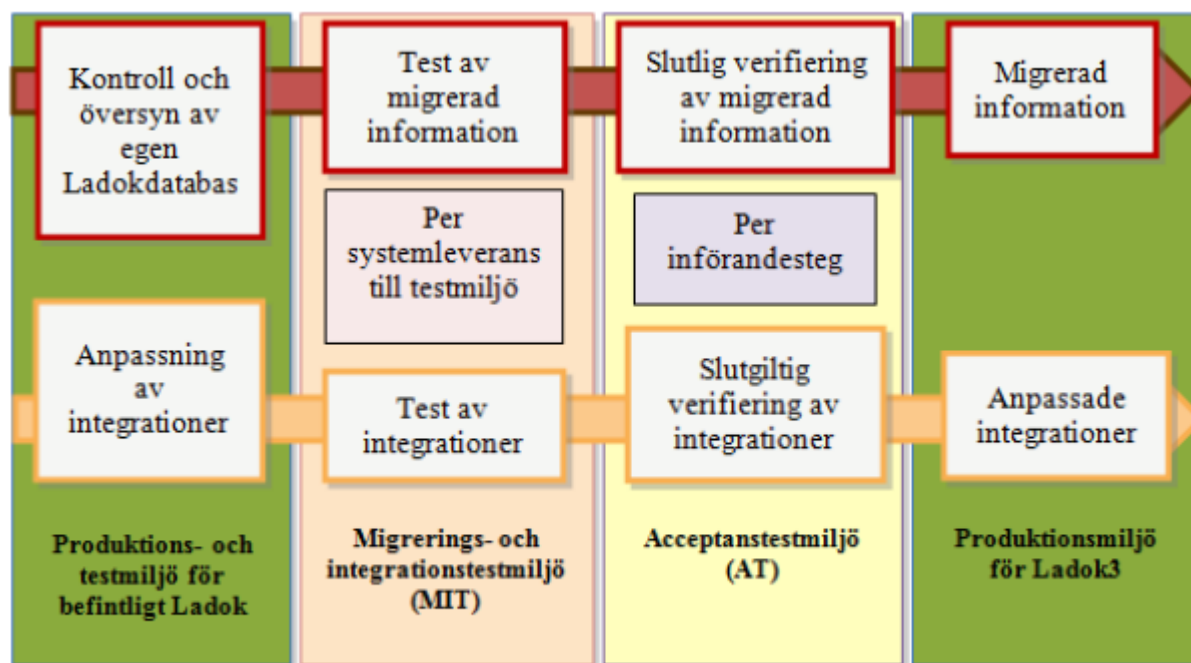

Figur 8: Aktiviteter i de olika miljöerna



# Testning

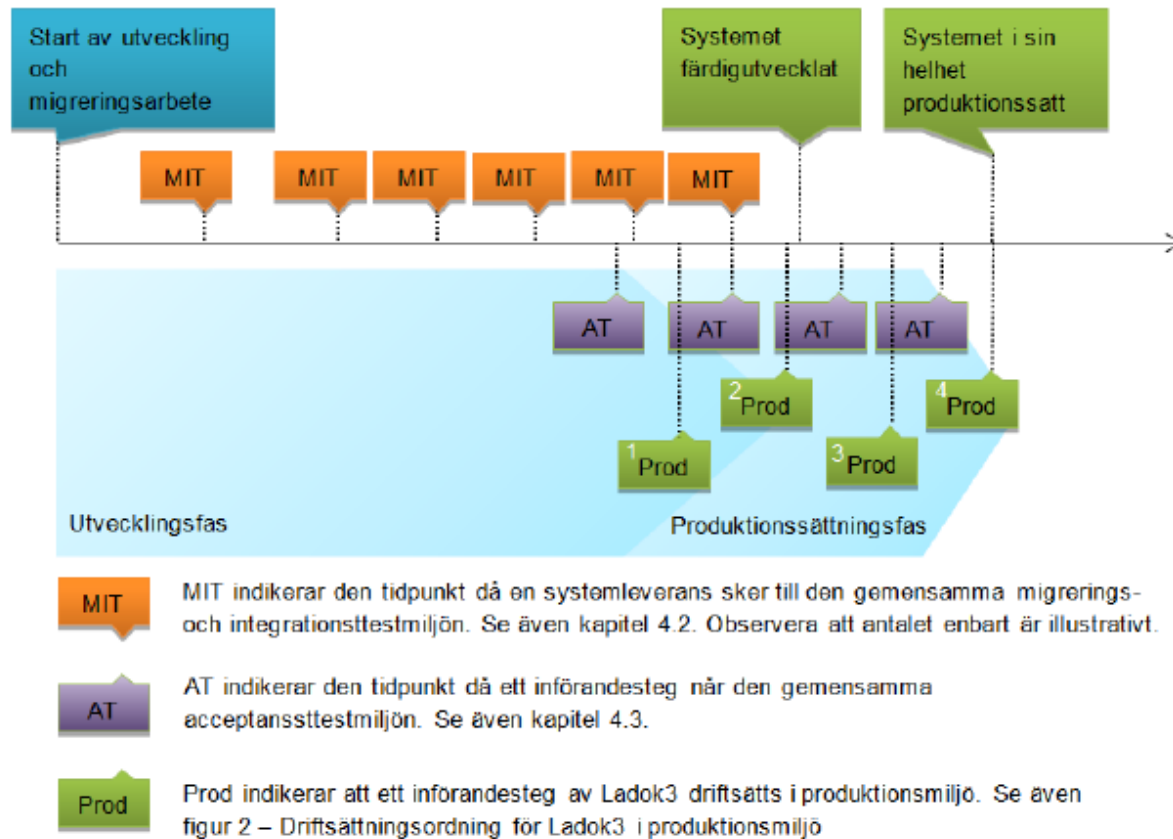

Figur 1: Översiktlig plan för leveranser till olika miljöer





# Testning – leverans av tjänstegränssnitt

Mängd färdigutvecklade tjänstegränssnitt	Datum för - Specifikation av tjänstegränssnitt
25 % motsvarande införandesteg 1	April 2013
50 % motsvarande införandesteg 1	Augusti 2013
75 % motsvarande införandesteg 1	Mars 2014
100 % motsvarande införandesteg 1	November 2014
100 % motsvarande införandesteg 2	April 2015
100 % motsvarande införandesteg 3	November 2015
100 % motsvarande införandesteg 4	November 2015

*Tabell 2: Specifikationer av tjänstegränssnittsleveranser*



# Information

- Löpande på SA-refensgruppsmöten framöver
- Ladok 3 på LU – blogg: <http://ladok3palu.blogg.lu.se/>  
Prenumerera gärna med RSS-teknik för löpande uppdatering
- Ladok3-projektet:  
<https://www.ladok.se/index.php?id=ladok3>

